

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: «44210000-5 Конструкції та їх частини (44211100-3 Модульні та переносні споруди)(Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (24х50))».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-17-010306-a

1. Технічні та якісні характеристики

Збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення для зберігання техніки (24х50)


№ з/п	Найменування	Основні положення для розробки
1	<i>Підстава для розробки</i>	Комерційна пропозиція
2	<i>Вид споруди</i>	Збірно-розбірна
3	<i>Геодезія</i>	Визначення (встановлення) меж земельної ділянки у місці розміщення збірно-розбірної комплексної споруди
4	<i>Інженерні вишукування</i>	В обсязі який необхідний
5	<i>Призначення об'єкта</i>	Збірно-розбірна комплексна споруда для зберігання техніки
6	<i>Конструктивні рішення</i>	Комплексна споруда. Обладнана системою пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, заземлення та блискавкозахисту.
6.1	Каркас збірно-розбірний, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень. Антикорозійний захист конструкцій каркасу – ґрунтування (антикорозійне покриття) металевих конструкцій згідно вимог діючих ДСТУ та фарбове покриття, колір якого узгоджується із Замовником (Покупцем)
6.2	Основа під опори	Передбачено з міцних та надійних конструкційних елементів, що можуть тримати навантаження споруди з урахуванням ґрунтової основи (тип та параметри опори споруди визначаються опираючись на п. 4.).
6.3	В'язі збірно-розбірні, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень.
6.4	Ферми збірно-розбірні, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень.
6.5	Дах	Двосхилий з водозабором (відведення дощових і талих вод) та снігозатримувачами, покриття - панелі металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати, зовнішня та внутрішня сторона з сталевого профільного або гладкого листа.
6.6	Стіни зовнішні та внутрішні перегородки	Панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати, зовнішня та внутрішня сторона з сталевого профільного або гладкого листа.
6.7	Стеля	Без стелі.
6.8	Основа	Ущільнений ґрунт з щебеневою підготовкою. Відмостка по периметру споруди та бетонні пандуси для заїзду техніки.

6.9	Підлога	Шліфувана бетонна армована плита з фінішним покриттям топінгом.
6.10	Двері вхідні	3 шт. - розміром 900x2000 (2100)мм, вбудовані в секційні промислові ворота.
6.11	Ворота в'їзні для вантажного транспорту	3 шт. - секційні, з вертикальним підйомом, розміром 4000x4200(h)мм. Товщина панелі-наповнення 40 мм. Укомплектовані засувкою і амортизатором зсередини. Редуктор ручний ланцюговий з передаточним числом 4:1. У ворота інтегрований дверний блок розміром 900x2000 (2100) (h), відповідно до п. 6.10. 7 шт. - секційні, з вертикальним підйомом, розміром 4000x4200(h)мм. Товщина панелі-наповнення 40 мм. Укомплектовані засувкою і амортизатором зсередини. Редуктор ручний ланцюговий з передаточним числом 4:1.
6.12	Вікна	20 шт. - 1000x1115(h)мм металопластикові, глухі, з двокамерним склопакетом.
6.13	Блискавкозахист	1 комплект.
6.14	Система автоматичної пожежної сигналізації із обладнанням	1 комплект. Надається 10% запасних пожежних димових датчиків та 10% запасних пожежних ручних сповіщувачів від загальної кількості.
6.15	Заземлення	1 комплект.
6.16	Система аварійного освітлення із показчиками «ВИХІД» (режим роботи до 3 годин), із обладнанням	1 комплект.
6.17	Охоронна сигналізація	1 комплект.
7	Об'ємно - планувальні рішення	
7.1	Габаритні розміри по осям споруди, мм	50000±100x24000±100.
7.2	Висота від підлоги до нижнього краю ферм, не менше ніж, мм	5000
7.3	Кліматичні умови експлуатації: температура зовнішнього повітря, °C Відносна вологість повітря при температурі +20°C, не більше %	- 30±5°C...+40±5°C; 95%.
7.4	Інженерні мережі	Споруда оснащена системами електропостачання, освітлення, пожежної та охоронної сигналізації, заземленням та блискавкозахистом.
8	Обладнання	
8.1	LED світильник 36...40Вт лінійний	100 шт.
8.2	Світильник акумуляторний аварійний	20 шт.
8.3	LED прожектор зовнішній з фотореле	10 шт.
8.4	Ввідний щит	1 шт.

8.5	Розподільчий щит	2 шт.
8.6	Розетка накладна вологозахищена	20 шт.
8.7	Вимикачі подвійні вологозахищені	10 шт.
8.8	Вимикачі одинарні вологозахищені	3 шт.
8.9	Вогнегасник ВП-9	10 шт.
8.10	Вогнегасник ВП-50	4 шт.
9	Інші вимоги	
9.1	Електромережі	Розраховані на підключення до існуючої системи електропостачання. Кабельна продукція прокладена в лотках, гофрованій трубі або кабельних каналах. Головний розподільний щит захищений від вологи, з місцем під лічильник. Кабель на розеткові групи - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х2.5 мм² Кабель на групи освітлення - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х1.5 мм². Електрообладнання Schneider Electric, ETI, ABB, E.NEXT. Усі рішення відповідають ДСТУ Б В.2.2-33:2011, ПУЕ.
9.2	Заземлення	Виконане відповідно до вимог керівних документів з відповідними замірами опору.
9.3	Блискавкозахист	Виконаний відповідно до вимог керівних документів з відповідними замірами опору. Блискавкоприймач висотою до 2,0 м, з провідника діаметром 10 мм, який приєднується до контуру заземлення.
9.4	Погодження матеріалів, обладнання та інженерних мереж.	RAL сендвіч-панелей, дверей, вікон погоджуються з Покупцем. Виводи інженерних мереж опалення, водопостачання, каналізації та електропостачання, у разі їх наявності, погоджуються із Покупцем.
9.5	Гарантійний термін експлуатації	Гарантійний термін експлуатації споруди, конструкцій, деталей, вузлів, обладнання, приладів становить 24 місяці.
9.6	Технічна документація	Паспорт на споруду. Керівництво з експлуатації споруди. Сертифікати (паспорти) на всі види обладнання інженерного забезпечення. Сертифікат відповідності на збірно-розбірну комплексну споруду спеціального призначення виданий органом, що акредитований Національним агентством з акредитації України та зареєстрований в реєстрі (товар має відповідати Технічним вимогам виробника на запропонований товар, з підтвердженням серійного виробництва та урахуванням гарантійного терміну зберігання). Виконавчі схеми на усі інженерні мережі та елементи безпеки, проектна документація на змонтовану систему оповіщення про пожежу, акт приймання системи оповіщення про пожежу в експлуатацію, акт підтвердження відповідності системи, акт проведення прихованих робіт монтажу системи оповіщення про пожежу.

		Виконавчі схеми розміщення освітлювальних приладів, розміщення кінцевих споживачів енергії, однолінійні щитового обладнання, розміщення вентиляційних мереж та обладнання, прокладання блискавкозахисту та заземлення. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність медичним критеріям безпеки здоров'я на збірно-розбірну комплексну споруду спеціального призначення виданий організацією що займається санітарно-епідеміологічною експертизою відповідно до свого Статуту, з підтвердженням що рівень радіонуклідів не перевищує допустимий рівень згідно вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».
9.7	Доставка до місця монтажу, вантажно-розвантажувальні роботи, монтаж	Здійснюється за рахунок Постачальника на підготовлений майданчик Покупця.

ПЛАН-СХЕМА

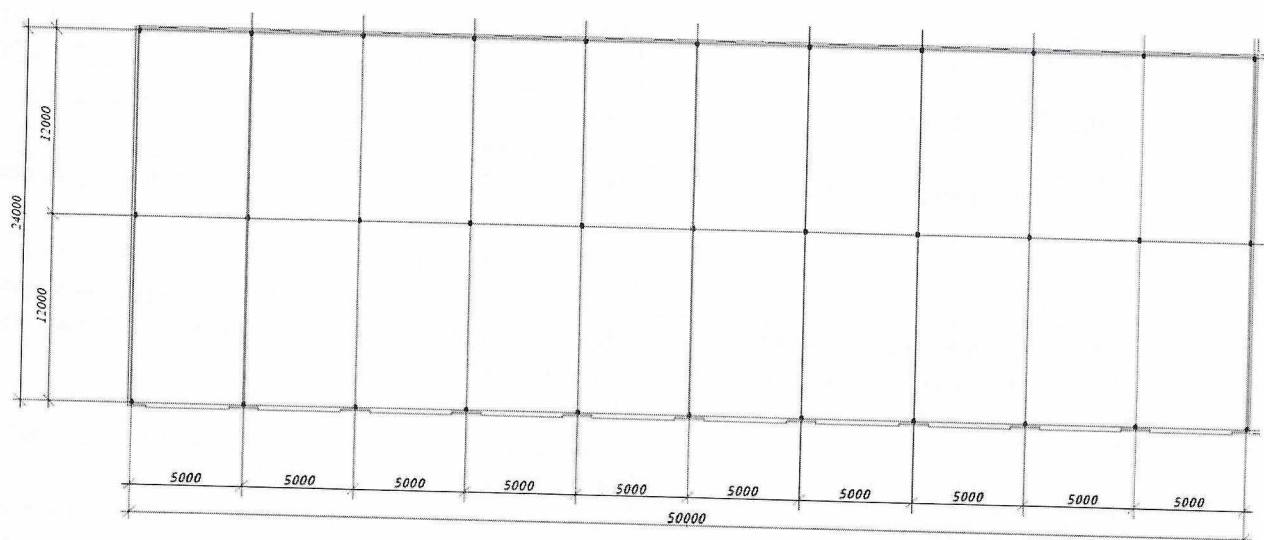

2. Загальні вимоги, що вимагаються Замовником.

2.1. Будівлі мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.2-22:2008 та вимогам відповідних ДБН щодо функціонального призначення будівель.

2.2. Вимоги до будівель щодо сприйняття навантажень і впливів та теплотехнічних показників - згідно додатків А, Б ДСТУ Б В.2.2-22:2008.

2.3. Вимоги до монтажу, ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. Сталеві конструкції та елементи будівель мають бути обґрунтовані відповідно до вимог діючих нормативних документів для забезпечення належного антикорозійного захисту та збереження їх технічних характеристик протягом розрахункового строку експлуатації будівлі.

2.4.Змонтовані будівлі повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, передбаченим згідно ДБН В.1.1-7:2016 в частині обмеження поширення пожежі в будинках, забезпечення евакуації людей та системи протипожежного захисту.

2.5.Інженерне обладнання та мережі повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок та Правил пожежної безпеки в Україні.

2.6.Розрахунковий строк експлуатації будівлі - не менше ніж 20 років.

2.7.Гарантійний строк відраховується від дня підписання сторонами акту приймання-передачі і має бути не менше ніж 24 місяці.

2.8.У разі якщо в документації або технічних матеріалах зазначені нормативні документи, що втратили чинність, застосуванню підлягають чинні нормативні документи, які їх замінюють, або чинні нормативні вимоги, що регулюють відповідний вид робіт на дату їх виконання.

2.9. Товар повинен бути упакований Учасником відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар відвантажується в упаковці, що відповідає його характеру.

2.10. У разі поставки неякісного Товару або Товару з дефектами Учасник повинен безоплатно замінити Товар неналежної якості, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліки Товару. Обмін Товару та повернення неякісного товару відбувається за рахунок Постачальника.

2.11.Гарантійне обслуговування та ремонт товару надається протягом встановленого Договором гарантійного строку.

2.12.Місце поставки та монтажу (встановлення) Товару: Сумська область, Роме-нський район, Роменська територіальна громада, комплекс будівель та споруд № 4, вул. Миру, 1.

2.13. Приймання товару здійснюється обов'язково при представнику Постачальника.

Приймання товару буде здійснюватися згідно документів приймання-передачі товару та обов'язково з наданням копій підтверджуючих документів відповідності.

Такі документи повинні бути діючими з урахуванням терміну реалізації товару. Пропозиції в яких поставка товарів здійснюється поштовими відправленнями («Нова Пошта» або ін.) не розглядаються.

2.14. Строк поставки протягом 90 календарних днів з моменту надання заявки Замовником Постачальнику але граничний термін поставки та монтажу (встановлення) Товару становить до 30.11.2026 р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики визначено з урахуванням потреб замовника, загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, зокрема, але не обмежуючись: ЗУ «Про публічні закупівлі», Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або

скасування», Наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі».

Технічні та якісні характеристики визначено з урахуванням потреб замовника, враховуючи штати на норми забезпечення, специфіки виконання службових завдань, умов експлуатації та необхідності забезпечення належних умов для зберігання техніки. При формуванні технічних та якісних характеристик до закупівлі збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення для зберігання техніки (24x50) враховано необхідність забезпечення:

надійності та безпечності конструкції;
можливості швидкого монтажу, демонтажу та переміщення споруди;
стійкості до зовнішніх кліматичних впливів;
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів;
можливість проведення огляду та підтримання відповідності чинним будівельним, технічним та безпековим нормам і стандартам.

Визначені технічні та якісні характеристики є обґрунтованими, об'єктивно необхідними для забезпечення належного функціонування споруди за призначенням та не містять дискримінаційних вимог, що обмежують конкуренцію або призводять до звуження кола потенційних учасників закупівлі.

Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі враховуючи ринкові ціни на аналогічні товари та враховуючи фінансово-господарську доцільність здійснення закупівлі на 2026 рік за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Очікувана вартість становить 28 088 400,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до розміру очікуваної вартості предмета закупівлі на 2026 рік за кодом ДК 021:2015, застосовано процедуру закупівлі – відкриті торги з особливостями, згідно пункту 10 постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Очікувана вартість визначалася відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" та інформацією отриманою через мережу інтернет (відповідна роздруковка додається).

Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку та бюджетного призначення на закупівлю.

Уповноважена особа з питань
організації та проведення
процедур закупівель



Людмила ЗАХАРЧЕНКО

ТОВ «703 Металообробний завод
котельного обладнання»
ЄДРПОУ 36476658
Тел. (044)223-78-99,
факс (044)407-15-99
E-mail: 703moz@gmail.com
www.703mozko.com

МОЗКО

LLC «703 Metalworking plant
boiler equipment»
USREOU 36476658
Tel. (044)223-78-99,
Fax (044)407-15-99
E-mail: 703moz@gmail.com
www.703mozko.com

Вих. № 166 від 04.05.2026р.

МРЦ ШР «Суми» ДСНС України

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «703 Металообробний завод котельного обладнання» просить розглянути комерційну пропозицію щодо придбання збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення для зберігання техніки розміром 24х50 м.

Пропозиція сформована з урахуванням типових умов договору про закупівлю, а саме:

- відстрочка платежу – 7 календарних днів;
- включено доставку до місця поставки;
- виконання монтажних-наладжувальних робіт.

Місце поставки: Сумська область, Роменський район, Роменська міська територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №4, вул. Миру, 1.

Вартість: 30 000 000,00 грн., у тому числі ПДВ.


Термін виконання: Виготовлення та монтаж споруди – до 8 місяців.

Гарантія:

Гарантійні зобов'язання на продукцію та монтаж – 24 місяці.

Сподіваємось на плідну співпрацю та готові надати додаткову інформацію за потреби.

Директор ТОВ «703 МОЗКО»



Тетяна НАЗАРОВА

ТОВ "Будівельна Компанія Богдан"

02660 м Київ вул. Старосільська 1 Є
т/ф +38(044)581-51-15

E-mail: dmytro.chernish@icloud.com

LLC "Construction Company Bogdan"

02660 Kyiv, Starosilska St.1E
Tel/fax :+38(044)581-51-15

E-mail: dmytro.chernish@icloud.com



№1-29 від 29 квітня 2026р.

**МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО
РЕАГУВАННЯ «СУМИ» ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

Стосовно запиту комерційної пропозиції

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Будівельна компанія «Богдан» (код ЄДРПОУ 37423240) пропонує до постачання збірно-розбірну комплексну споруду спеціального призначення для зберігання техніки (розмір 24х50 м), що є сучасним та ефективним рішенням для розміщення та захисту техніки.

У вартість пропозиції входить:

- виготовлення конструкції;
- доставка на об'єкт;
- повний комплекс монтажних-налагоджувальних робіт.

Загальна вартість: 30 360 000,00 грн з ПДВ. (Тридцять мільйонів триста шістдесят тисяч гривень 00 копійок)

Повний цикл виготовлення та монтажу – до 4 місяців.

Гарантійні зобов'язання: 12 місяці на конструкцію та виконані роботи.

Ми гарантуємо якість, дотримання строків та професійний підхід до реалізації проекту.

**Директор
ТОВ «Будівельна компанія
«Богдан»**



Д.М. Черниш

ТОВ «ПАРТНЕР-ВС»

вул. Сергія Параджанова, 93 м. Житомир,
Україна, 10001
e-mail: office@partner-vs.com
www.partner-vs.com
тел./факс: +38 (0412) 42-80-86



VIBROSEPARATOR



Ltd «PARTNER-VS»

93, Serhiy Paradzhanov street, Zhytomyr,
10001, Ukraine
e-mail: office@partner-vs.com
www.partner-vs.com
phone/fax: +38 (0412) 42-80-86

17 квітня 2026 року № 767

Начальнику МРЦ ШР «Суми» ДСНС України

Комерційна пропозиція

На Ваш лист-запит від 16.04.26 № 77-1371/77 17 згідно технічного опису та вимог, ТОВ «Партнер-ВС» надає комерційну пропозицію на **«Збірно-розбірну комплексну споруду спеціального призначення для зберігання техніки (24x50 (м)).»**


№ п/п	Найменування товарів	Од. вим.	К - ть	Ціна грн./од. з ПДВ	Вартість грн. з ПДВ
1.	Збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення для зберігання техніки (24x50) м	шт.	1	35 000 000,00	35 000 000,00
Всього					35 000 000,00
в тому числі ПДВ					5 833 333,33

Загальна вартість даної пропозиції складає **35 000 000** (Тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок з ПДВ.


Генеральний директор



Ірина ТУЗ



6.11	Ворота в'їзні для вантажного транспорту	3 шт. - секційні, з вертикальним підйомом, розміром 4000x4200(h)мм. Товщина панелі-наповнення 40 мм. Укомплектовані засувкою і амортизатором зсередини. Редуктор ручний ланцюговий з передаточним числом 4:1. У ворота інтегрований дверний блок розміром 900x2000 (2100)(h), відповідно до п. 6.10. 7 шт. - секційні, з вертикальним підйомом, розміром 4000x4200(h)мм. Товщина панелі-наповнення 40 мм. Укомплектовані засувкою і амортизатором зсередини. Редуктор ручний ланцюговий з передаточним числом 4:1.
6.12	Вікна	20 шт. - 1000x1115(h)мм металопластикові, глухі, з двокамерним склопакетом.
6.13	Блискавкозахист	1 комплект.
6.14	Система автоматичної пожежної сигналізації із обладнанням	1 комплект. Надається 10% запасних пожежних димових датчиків та 10% запасних пожежних ручних сповіщувачів від загальної кількості.
6.15	Заземлення	1 комплект.
6.16	Система аварійного освітлення із показчиками «ВИХІД» (режим роботи до 3 годин), із обладнанням	1 комплект.
6.17	Охоронна сигналізація	1 комплект.
7	Об'ємно - планувальні рішення	
7.1	Габаритні розміри по осям споруди, мм	50000±100x24000±100.
7.2	Висота від підлоги до нижнього краю ферм, не менше ніж, мм	5000
7.3	Кліматичні умови експлуатації: температура зовнішнього повітря, °C Відносна вологість повітря при температурі +20°C, не більше %	- 30±5°C...+40±5°C; 95%.
7.4	Інженерні мережі	Споруда оснащена системами електропостачання, освітлення, пожежної та охоронної сигналізації, заземленням та блискавкозахистом.
8	Обладнання	
8.1	LED світильник 36...40Вт лінійний	100 шт.
8.2	Світильник акумуляторний аварійний	20 шт.
8.3	LED прожектор зовнішній з фотореле	10 шт.
8.4	Ввідний щит	1 шт.
8.5	Розподільчий щит	2 шт.



Технічний опис Збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення для зберігання техніки (24х50)

№ з/п	Найменування	Основні положення для розробки
1	Підстава для розробки	Комерційна пропозиція
2	Вид споруди	Збірно-розбірна
3	Геодезія	Визначення (встановлення) меж земельної ділянки у місці розміщення збірно-розбірної комплексної споруди
4	Інженерні вишукування	В обсязі який необхідний
5	Призначення об'єкта	Збірно-розбірна комплексна споруда для зберігання техніки
6	Конструктивні рішення	Комплексна споруда. Обладнана системою пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, заземлення та блискавкозахисту.
6.1	Каркас збірно-розбірний, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень. Антикорозійний захист конструкцій каркасу – ґрунтування (антикорозійне покриття) металевих конструкцій згідно вимог діючих ДСТУ та фарбове покриття, колір якого узгоджується із Замовником (Покупцем)
6.2	Основа під опори	Передбачено з міцних та надійних конструкційних елементів, що можуть тримати навантаження споруди з урахуванням ґрунтової основи (тип та параметри опори споруди визначаються опираючись на п. 4.).
6.3	В'язі збірно-розбірні, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень.
6.4	Ферми збірно-розбірні, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень.
6.5	Дах	Двосхилий з водозабором (відведення дощових і талих вод) та снігозатримувачами, покриття - панелі металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати, зовнішня та внутрішня сторона з сталевого профільного або гладкого листа.
6.6	Стіни зовнішні та внутрішні перегородки	Панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати, зовнішня та внутрішня сторона з сталевого профільного або гладкого листа.
6.7	Стеля	Без стелі.
6.8	Основа	Ущільнений ґрунт з щебеневою підготовкою. Відмостка по периметру споруди та бетонні пандуси для заїзду техніки.
6.9	Підлога	Шліфувана бетонна армована плита з фінішним покриттям топінгом.
6.10	Двері входні	3 шт. - розміром 900х2000 (2100)мм, вбудовані в секційні промислові ворота.

Комерційна пропозиція

У відповідь на Ваш лист від 16.04.2026 №77-1369/77 17, ТОВ «РЕД БУД» просить розглянути комерційну пропозицію щодо придбання Збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення для зберігання техніки (24x50) (далі - Споруда). Детальний технічний опис Споруди наведено в додатку до даної Комерційної пропозиції (додається).

Конструкція Споруди передбачає можливість відносно швидкого монтажу на підготовленому майданчику замовника.


Споруда оснащена системами електропостачання, освітлення, пожежної та охоронної сигналізації, заземленням та блискавкозахистом.

Споруда являє собою збірну каркасну конструкцію з утепленням. Габаритні розміри по осям споруди становлять $50\,000 (\pm 100) \times 24\,000 (\pm 100)$. Висота від підлоги до нижнього краю ферм становить не менше ніж 5 000 мм.

Несучі конструкції виготовлені з металевих профілів для будівництва.

Термін виготовлення та монтажу однієї Споруди – до 3-х місяців з моменту підписання відповідного договору.

ПЛАН-СХЕМА

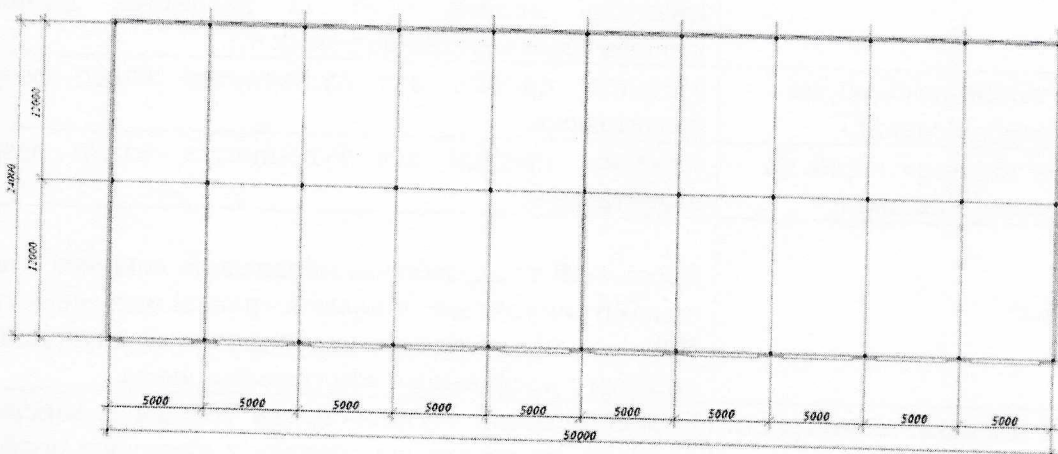

Загальна вартість цієї комерційної пропозиції за одну Збірно-розбірну комплексну споруду спеціального призначення для зберігання техніки (24x50) складає – 31 200 000 (Тридцять один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок з ПДВ, до вартості також входять витрати на транспортування та монтаж споруди.

Просимо звернути увагу на різке підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, що спричиняє та може спричиняти в майбутньому подорожчання транспортної складової та ціни товару в загалом.

Директор

вик. А. Заїка
050 357 32 70



Антон ЗАІКА

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕД БУД»
вул. Жилианська, буд. 148 Б, Київ, Україна, 01135
тел: +38 050 3573270



E-mail: office.lifebud@gmail.com thermal-insulation.com.ua termochehol.com
тел: +38 (067) 572 50 73
МФО: 334851
Код ЄДРПОУ: 41932124
ІПН: 419321226560

Юридична адреса: 04050, м.Київ,
Шевченківський район, вул. Глибочицька, буд. 72,
корпус новий, оф. 309
Адреса виробництва: 35700, Рівненська обл.,
Здолбунівський р-н, місто Здолбунів,
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 1 А

Вих. №154/18

МРЦ ШР «Суми» ДСНС України

Комерційна пропозиція


ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙФ-БУД» просить розглянути комерційну пропозицію щодо придбання Збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення для зберігання техніки (24x50), з урахуванням типових умов договору про закупівлю, зокрема, відстрочки платежу на 7 днів, доставки та проведення монтажних робіт.

Місце поставки: Сумська область, Роменський район, Роменська міська територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №4, вул. Миру, 1

Вартість Збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення для зберігання техніки (24x50) становить 36 010 000,00 грн (Тридцять шість мільйонів десять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Термін виготовлення та монтаж споруди – 6 місяців. Гарантійні зобов'язання на продукцію та монтаж – 12 місяців.

ПЛАН-СХЕМА

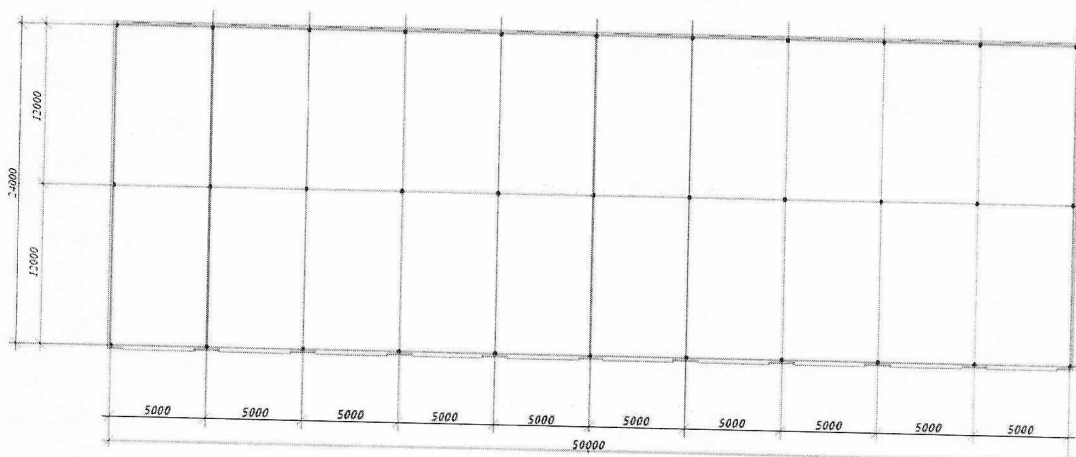


ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙФ-БУД»

Директор


Юрченко С.С.

+380675725073



		перевищує допустимий рівень згідно вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».
9.7	Доставка до місця монтажу, вантажно-розвантажувальні роботи, монтаж	Здійснюється за рахунок Постачальника на підготовлений майданчик Покупця.

ПЛАН-СХЕМА

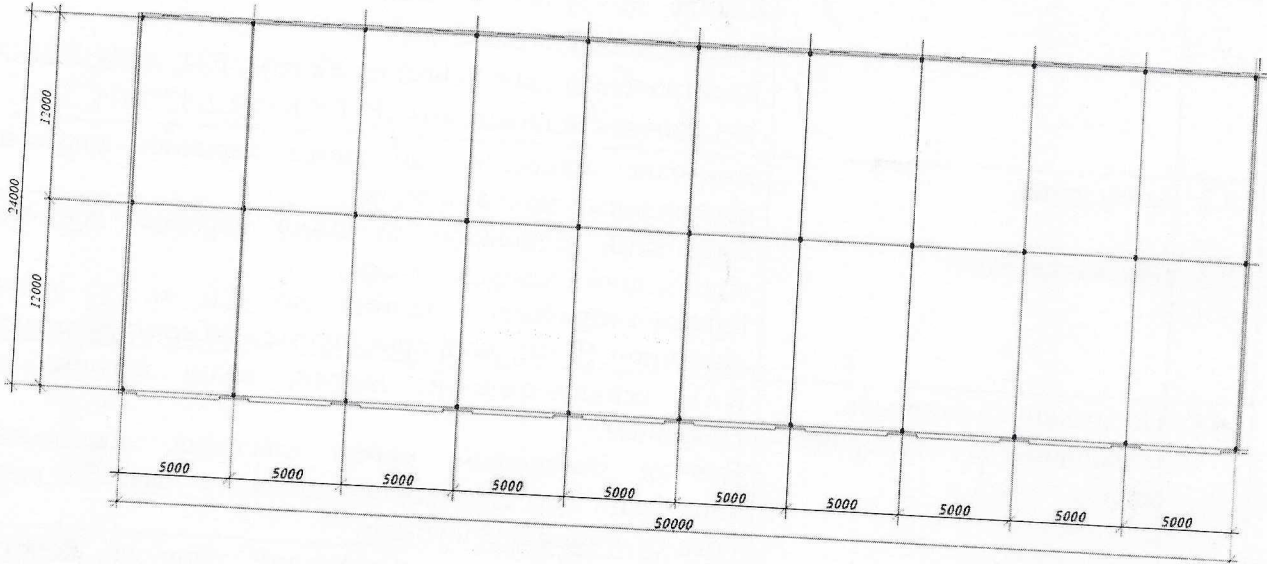

9.1	Електромережі	Розраховані на підключення до існуючої системи електропостачання. Кабельна продукція прокладена в лотках, гофрований трубі або кабельних каналах. Головний розподільний щит захищений від вологи, з місцем під лічильник. Кабель на розеткові групи - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х2.5 мм² Кабель на групи освітлення - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3х1.5 мм². Електрообладнання Schneider Electric, ETI, ABB, E.NEXT. Усі рішення відповідають ДСТУ Б В.2.2-33:2011, ПУЕ.
9.2	Заземлення	Виконане відповідно до вимог керівних документів з відповідними замірами опору.
9.3	Блискавкозахист	Виконаний відповідно до вимог керівних документів з відповідними замірами опору. Блискавкоприймач висотою до 2,0 м, з провідника діаметром 10 мм, який приєднується до контуру заземлення.
9.4	Погодження матеріалів, обладнання та інженерних мереж.	RAL сендвіч-панелей, дверей, вікон погоджуються з Покупцем. Виводи інженерних мереж опалення, водопостачання, каналізації та електропостачання, у разі їх наявності, погоджуються із Покупцем.
9.5	Гарантійний термін експлуатації	Гарантійний термін експлуатації споруди, конструкцій, деталей, вузлів, обладнання, приладів становить 24 місяці.
9.6	Технічна документація	Паспорт на споруду. Керівництво з експлуатації споруди. Сертифікати (паспорти) на всі види обладнання інженерного забезпечення. Сертифікат відповідності на збірно-розбірну комплексну споруду спеціального призначення виданий органом, що акредитований Національним агентством з акредитації України та зареєстрований в реєстрі (товар має відповідати Технічним вимогам виробника на запропонований товар, з підтвердженням серійного виробництва та урахуванням гарантійного терміну зберігання). Виконавчі схеми на усі інженерні мережі та елементи безпеки, проектна документація на змонтовану систему оповіщення про пожежу, акт приймання системи оповіщення про пожежу в експлуатацію, акт підтвердження відповідності системи, акт проведення прихованих робіт монтажу системи оповіщення про пожежу. Виконавчі схеми розміщення освітлювальних приладів, розміщення кінцевих споживачів енергії, однолінійні щитового обладнання, розміщення вентиляційних мереж та обладнання, прокладання блискавкозахисту та заземлення. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність медичним критеріям безпеки здоров'я на збірно-розбірну комплексну споруду спеціального призначення виданий організацією що займається санітарно-епідеміологічною експертизою відповідно до свого Статуту, з підтвердженням що рівень радіонуклідів не

		4000x4200(h)мм. Товщина панелі-наповнення 40 мм. Укомплектовані засувкою і амортизатором зсередини. Редуктор ручний ланцюговий з передаточним числом 4:1.
6.12	Вікна	20 шт. - 1000x1115(h)мм металопластикові, глухі, з двокамерним склопакетом.
6.13	Блискавкозахист	1 комплект.
6.14	Система автоматичної пожежної сигналізації із обладнанням	1 комплект. Надається 10% запасних пожежних димових датчиків та 10% запасних пожежних ручних сповіщувачів від загальної кількості.
6.15	Заземлення	1 комплект.
6.16	Система аварійного освітлення із показчиками «ВИХІД» (режим роботи до 3 годин), із обладнанням	1 комплект.
6.17	Охоронна сигналізація	1 комплект.
7	Об'ємно - планувальні рішення	
7.1	Габаритні розміри по осям споруди, мм	50000±100x24000±100.
7.2	Висота від підлоги до нижнього краю ферм, не менше ніж, мм	5000
7.3	Кліматичні умови експлуатації: температура зовнішнього повітря, °С Відносна вологість повітря при температурі +20°С, не більше %	- 30±5°С...+40±5°С; 95%.
7.4	Інженерні мережі	Споруда оснащена системами електропостачання, освітлення, пожежної та охоронної сигналізації, заземленням та блискавкозахистом.
8	Обладнання	
8.1	LED світильник 36...40Вт лінійний	100 шт.
8.2	Світильник акумуляторний аварійний	20 шт.
8.3	LED прожектор зовнішній з фотореле	10 шт.
8.4	Ввідний щит	1 шт.
8.5	Розподільчий щит	2 шт.
8.6	Розетка накладна вологозахищена	20 шт.
8.7	Вимикачі подвійні вологозахищені	10 шт.
8.8	Вимикачі одинарні вологозахищені	3 шт.
8.9	Вогнегасник ВП-9	10 шт.
8.10	Вогнегасник ВП-50	4 шт.
9	Інші вимоги	

Технічний опис
Збірно-розбірної комплексної споруди спеціального призначення
для зберігання техніки (24x50)

№ з/п	Найменування	Основні положення для розробки
1	<i>Підстава для розробки</i>	Комерційна пропозиція
2	<i>Вид споруди</i>	Збірно-розбірна
3	<i>Геодезія</i>	Визначення (встановлення) меж земельної ділянки у місці розміщення збірно-розбірної комплексної споруди
4	<i>Інженерні вишукування</i>	В обсязі який необхідний
5	<i>Призначення об'єкта</i>	Збірно-розбірна комплексна споруда для зберігання техніки
6	<i>Конструктивні рішення</i>	Комплексна споруда. Обладнана системою пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, заземлення та блискавкозахисту.
6.1	Каркас збірно-розбірний, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень. Антикорозійний захист конструкцій каркасу – грунтування (антикорозійне покриття) металевих конструкцій згідно вимог діючих ДСТУ та фарбове покриття, колір якого узгоджується із Замовником (Покупцем)
6.2	Основа під опори	Передбачено з міцних та надійних конструкційних елементів, що можуть тримати навантаження споруди з урахуванням ґрунтової основи (тип та параметри опори споруди визначаються опираючись на п. 4.).
6.3	В'язі збірно-розбірні, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень.
6.4	Ферми збірно-розбірні, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва згідно розрахункових навантажень.
6.5	Дах	Двосхилий з водозабором (відведення дощових і талих вод) та снігозатримувачами, покриття - панелі металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати, зовнішня та внутрішня сторона з сталевого профільного або гладкого листа.
6.6	Стіни зовнішні та внутрішні перегородки	Панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати, зовнішня та внутрішня сторона з сталевого профільного або гладкого листа.
6.7	Стеля	Без стелі.
6.8	Основа	Ущільнений ґрунт з щебеневою підготовкою. Відмостка по периметру споруди та бетонні пандуси для заїзду техніки.
6.9	Підлога	Шліфована бетонна армована плита з фінішним покриттям топінгом.
6.10	Двері вхідні	3 шт. - розміром 900x2000 (2100)мм, вбудовані в секційні промислові ворота.
6.11	Ворота в'їзні для вантажного транспорту	3 шт. - секційні, з вертикальним підйомом, розміром 4000x4200(h)мм. Товщина панелі-наповнення 40 мм. Укомплектовані засувкою і амортизатором зсередини. Редуктор ручний ланцюговий з передаточним числом 4:1. У ворота інтегрований дверний блок розміром 900x2000 (2100)(h), відповідно до п. 6.10. 7 шт. - секційні, з вертикальним підйомом, розміром

Додаток №1
до Договору про закупівлю товарів за
державні кошти
№109 від 08.07. 2026 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Найменування	Одиниця вимірювання	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн., без ПДВ
1	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення	одиниця	1	10 625 000,00	10 625 000,00
Всього без ПДВ:					10 625 000,00
ПДВ*					2 125 000,00
Всього з ПДВ*					12 750 000,00

* у разі, якщо виконавець не є платником ПДВ, не заповнюється;

Загальна вартість включаючи всі податки та збори: 12 750 000 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Сторони підтверджують, що якість товарів відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам, що встановлені у Додатку 2 до Тендерної документації процедури закупівлі UA-2026-06-08-013103-а.

ЗАМОВНИК

Головний мобільний рятувальний
центр швидкого реагування
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій



Вячеслав БОЙЦОВ

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ»



Роман ЛОЙКО

$$12750000,00 / 620 \text{ м}^2 = 20564,52 \text{ грн. за } 1 \text{ м}^2$$

		Покупцем.
9.5	Гарантійний термін експлуатації	Гарантійний термін експлуатації споруди, конструкцій, деталей, вузлів, обладнання, приладів становить 36 місяців.
9.6	Технічна документація	Паспорт на споруду. Керівництво з експлуатації споруди. Сертифікати (паспорти) на всі види обладнання інженерного забезпечення. Сертифікат відповідності на збірно-розбірну комплексну споруду спеціального призначення виданий органом, що акредитований Національним агентством з акредитації України та зареєстрований в реєстрі (товар має відповідати Технічним вимогам виробника на запропонований товар, з підтвердженням серійного виробництва та урахуванням гарантійного терміну зберігання). Виконавчі схеми на усі інженерні мережі та елементи безпеки, проектна документація на змонтовану систему оповіщення про пожежу, акт приймання системи оповіщення про пожежу в експлуатацію, акт підтвердження відповідності системи, акт проведення прихованих робіт монтажу системи оповіщення про пожежу. Виконавчі схеми розміщення освітлювальних приладів, розміщення кінцевих споживачів енергії, однолінійні щитового обладнання, прокладання блискавкозахисту та заземлення.

Покупець	Постачальник
Національний університет цивільного захисту України 18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка,8 р/р UA218201720343190006000007078 UA378201720343181006200007078 Держказначейська служба України, м.Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 08571363 Свідоцтво №100280193 Тел. (0472) 55-09-53 E-mail: nuczu.@dsns.gov.ua Проректор з ресурсного забезпечення Національного університету цивільного захисту України Олександр ПЛАСТУН 	Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія «БУДСТАР ПЛЮС» 08130, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 27-А, р/р UA 493510050000026000389563900 в ПАТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 38183242, Св. №200121384, ПІН 381832410138 Директор Олександр ПРИДАНЮК 

		освітлення, пожежної та охоронної сигналізації, заземленням та блискавкозахистом
8	Обладнання	
8.1	LED світильник 36-40Вт лінійний	110 шт.
8.2	Світильник акумуляторний аварійний	22 шт.
8.3	LED прожектор зовнішній з фотореле	10 шт.
8.4	Ввідний щит	1 шт.
8.5	Розподільчий щит	2 шт.
8.6	Розетка накладна вологозахищена	46 шт.
8.7	Вимикачі подвійні вологозахищені	11 шт.
8.8	Вимикачі одинарні вологозахищені	4 шт.
8.9	Вогнегасник ВП-9	10 шт.
8.10	Вогнегасник ВП-50	4 шт.
9	Інші вимоги	
9.1	Електромережі	Електромережі об'єкта виконані відповідно до вимог чинних нормативних документів та розраховані для підключення до існуючої системи електропостачання. Кабельна продукція прокладена в лотках, гофрованій трубі або кабельних каналах. Головний розподільний щит захищений від вологи, з місцем під лічильник. Кабель на розеткові групи - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3x2.5 мм². Кабель на групи освітлення - мідний провід з подвійною ізоляцією ВВГнг 3x1.5 мм². Електрообладнання Schneider, Electric ,ETI, ABB, E.NEXT. Усі рішення відповідають ДСТУ Б В.2.2-33:2011, ПУЕ.
9.2	Заземлення	Виконане відповідно до вимог керівних документів з відповідними замірами опору.
9.3	Блискавкозахист	Виконаний відповідно до вимог керівних документів з відповідними замірами опору. Блискавкоприймач висотою 2,0 м, з провідника діаметром 10 мм, який приєднується до контуру заземлення.
9.4	Погодження матеріалів, обладнання та інженерних мереж.	РАІ сендвіч-панелей, дверей, вікон погоджуються з Покупцем. Виводи електропостачання будуть погоджені із

		пандуси для заїзду техніки.
6.9	Підлога	Шліфувана бетонна армована плита з фінішним покриттям топінгом.
6.10	Двері вхідні	2 шт. – розміром 900х2000 мм, вбудовані в секційні промислові ворота. 1 шт. – розміром 900х2000 (2100) мм, вбудовані в зовнішню стінову панель
6.11	Двері внутрішні	1 шт розміром 900х2000 (2100)мм вбудовані в внутрішню перегородку
6.12	Ворота в'їзні для вантажного транспорту	2 шт. – секційні, з вертикальним підйомом, розміром 4000х4200(h)мм. Товщина панелі-наповнення 40 мм. Укомплектовані засувкою і амортизатором зсередини. Редуктор ручний ланцюговий з передаточним числом 4:1. У ворота інтегрований дверний блок розміром 900х2000 (2100)(h), відповідно до п. 6.10. 9 шт. – секційні, з вертикальним підйомом, розміром 4000х4200(h)мм. Товщина панелі-наповнення 40 мм. Укомплектовані засувкою і амортизатором зсередини. Редуктор ручний ланцюговий з передаточним числом 4:1.
6.13	Вікна	22 шт. – 1000х1115(h)мм металопластикові, поворотно-відкидні, з двокамерним склопакетом та москітними сітками.
6.14	Блискавкозахист	1 комплект.
6.15	Система автоматичної пожежної сигналізації із обладнанням	1 комплект.
6.16	Заземлення	1 комплект.
6.17	Система аварійного освітлення із показниками «ВИХІД» (режим роботи до 3 годин), із обладнанням	1 комплект.
6.18	Охоронна сигналізація	1 комплект.
7	Об'ємно - планувальні рішення	
7.1	Габаритні розміри по осях колон, мм	59 400х 18 000
7.2	Висота від підлоги до нижнього краю ферм, не менше ніж, мм	4550
7.3	Кліматичні умови експлуатації: температура зовнішнього повітря, °С Відносна вологість повітря при температурі +20°С, не більше %	– 30±5°С...+40±5°С; 95%.
7.4	Інженерні мережі	Споруда оснащена системами електропостачання,

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ


№ з/п	Найменування	Характеристики споруди
1	<i>Вид споруди</i>	Збірно-розбірна
2	<i>Призначення об'єкта</i>	1-но поверхова збірно-розбірна комплексна споруда для зберігання техніки
3	<i>Інженерні вишукування</i>	Інженерногеологічні вишукування 6 свердловин по 8 м., Топозйомка
4	<i>Кількість товару</i>	1 одиниця
5	<i>Конструктивні рішення</i>	
6	Каркас збірно-розбірний, на болтовому з'єднанні (згідно ПЛАН-СХЕМИ)	Металеві профілі для будівництва. Каркас безвідмовно функціонуватиме під дією розрахункових навантажень протягом встановленого терміну експлуатації будівлі. Антикорозійний захист конструкцій каркасу: - для профілів ЛСТК цинкування першого класу (258 г/м ²); Антикорозійний захист конструкцій каркасу – ґрунтування (антикорозійне покриття) металевих конструкцій згідно вимог діючих ДСТУ та фарбове покриття, колір якого узгоджується із Покупцем.
6.1	Опори	Залізобетонні з анкерними закладними (тип, параметри опори та кількість визначається у відповідності до фізичних характеристик і корозійної властивості ґрунтів, опираючись на п.3).
6.2	Ферми та в'язі збірно-розбірні, на болтовому з'єднанні	Металеві профілі для будівництва, основний металевий профіль – труба, 180х180х5, 120х120х5мм., 60х60х3мм, 40 х40х3мм. Антикорозійний захист такий же, як для елементів основного каркасу
6.3	Конструкції даху	Збірно-розбірні металеві ферми у складі каркасу. Ґрунтування (антикорозійне покриття) металевих конструкцій – згідно вимог ДСТУ.
6.5	Дах	Двосхилий з водозабором (відведення дощових і талих вод) та снігозатримувачами, покриття – панелі металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати, зовнішня та внутрішня сторона з сталевого профільного листа.
6.6	Стіни зовнішні та внутрішні перегородки	Панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати, зовнішня та внутрішня сторона з сталевого профільного або гладкого листа.
6.7	Стеля	Без стелі.
6.8	Основа	Ущільнений ґрунт з щебеневою підготовкою. Відмостка по периметру споруди та бетонні

UA -2025-10-09-010153-a

до Договору № 452 від « 31 » 10 Додаток №1
2025 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування Товару	Кількість	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Сума, грн. з ПДВ
1	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (11 машино-місць) (44211100-3 Модульні та переносні споруди)	1 одиниця	24 787 000,00	24 787 000,00
Всього, грн. з ПДВ				24 787 000,00
в т. ч. ПДВ, грн.				4131166,67

Покупець	Постачальник
Національний університет цивільного захисту України 18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8 р/р UA218201720343190006000007078 UA378201720343181006200007078 Держказначейська служба України, м.Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 08571363 Свідоцтво №100280193 Тел. (0472) 55-09-53 E-mail: nuczu.@dsns.gov.ua Проректор з ресурсного забезпечення Національного університету цивільного захисту України  Олександр ПЛАСТУН МП	Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія «БУДСТАР ПЛЮС» 08130, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 27-А, р/р UA 493510050000026000389563900 в ПАТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 38183242, Св. №200121384, ПІН 381832410138 Директор  Олександр ПРИДАНИЮК МП 

$$24787000,00 / 1096,2 \text{ м}^2 = 23182,75 \text{ за } 1 \text{ м}^2$$
